



Autostrada dei Fiori

Tronco A6 Torino - Savona

PIANO CANTIERI INAMOVIBILI SINO AL 29.06.2025
*Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete autostradale
Ligure*
Tavolo di coordinamento del 31.03.2025




2 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI – NOTE GENERALI

N.B: nella grafica non sono indicate le chiusure notturne e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

█ Cantieri Deviazione (1D) █ Cantieri Riduzione (R1)
█ Tratti gestiti da ADF █ Tratti non gestiti da ADF

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana dei periodi primaverile/estivo


Cantiere rimosso nei fine settimana ✕

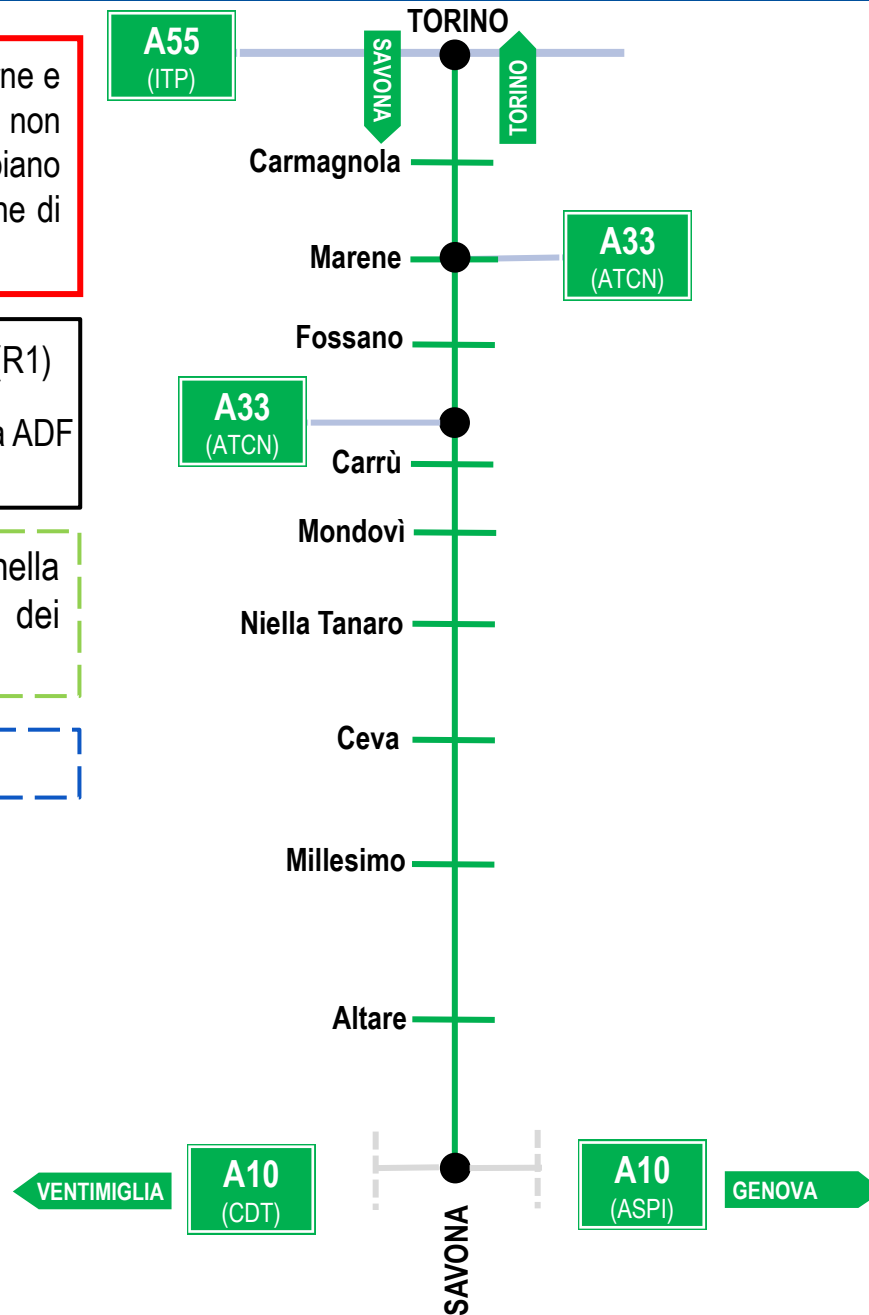

LEGENDA INTERVENTI

- Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
- Interventi su barriere di sicurezza
- Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
- Barriere acustiche
- Consolidamento versanti

3 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 31/03 A VENERDI' 4/04

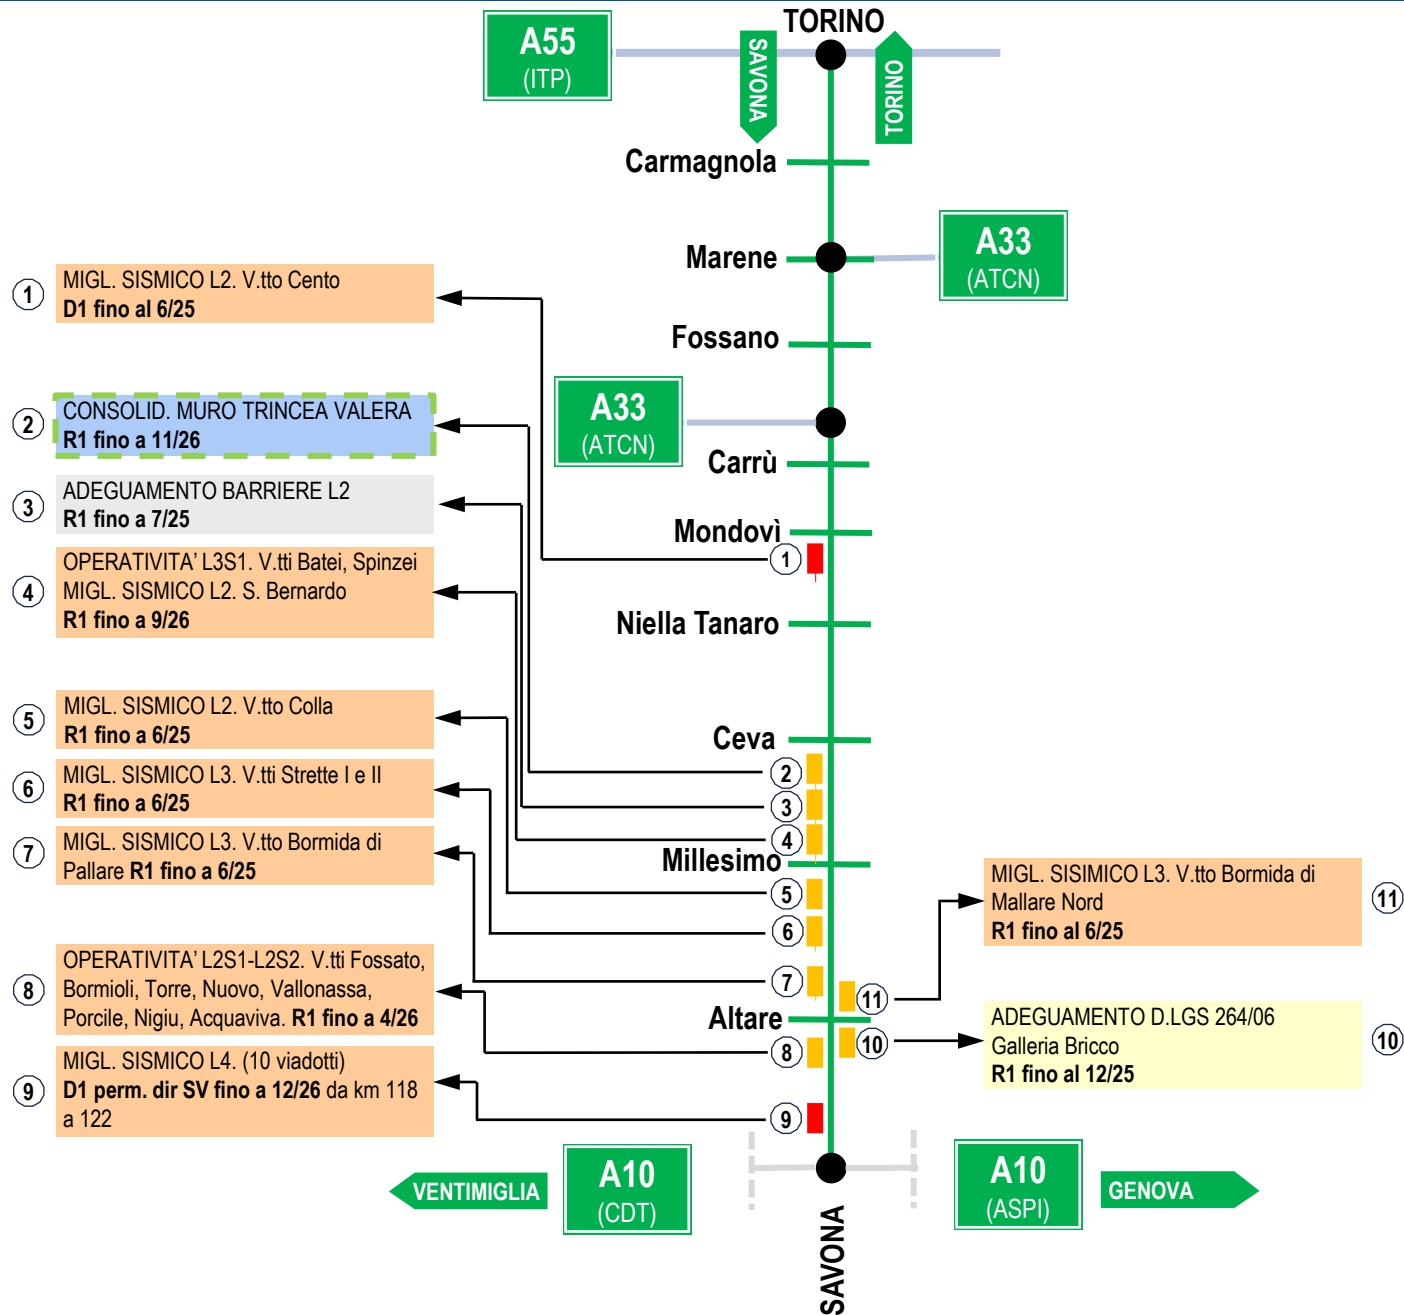

Configurazione FERIAI

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	21,4	17,2
TORINO	124,3	12,1	9,7

Configurazione FESTIVI

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	19,8	15,9
TORINO	124,3	12,1	9,7

(*) % di occupazione cantieri rispetto allo sviluppo della tratta


Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana e festivi

X Cantiere rimosso

■	Tratti gestiti da ADF
■	Tratti non gestiti da ADF
■	Cantieri Deviazione (1D)
■	Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI	
■	Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
■	Interventi su barriere di sicurezza
■	Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
■	Barriere acustiche
■	Consolidamento versanti

4 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI DA SABATO 5/04 A MERCOLEDI' 16/04

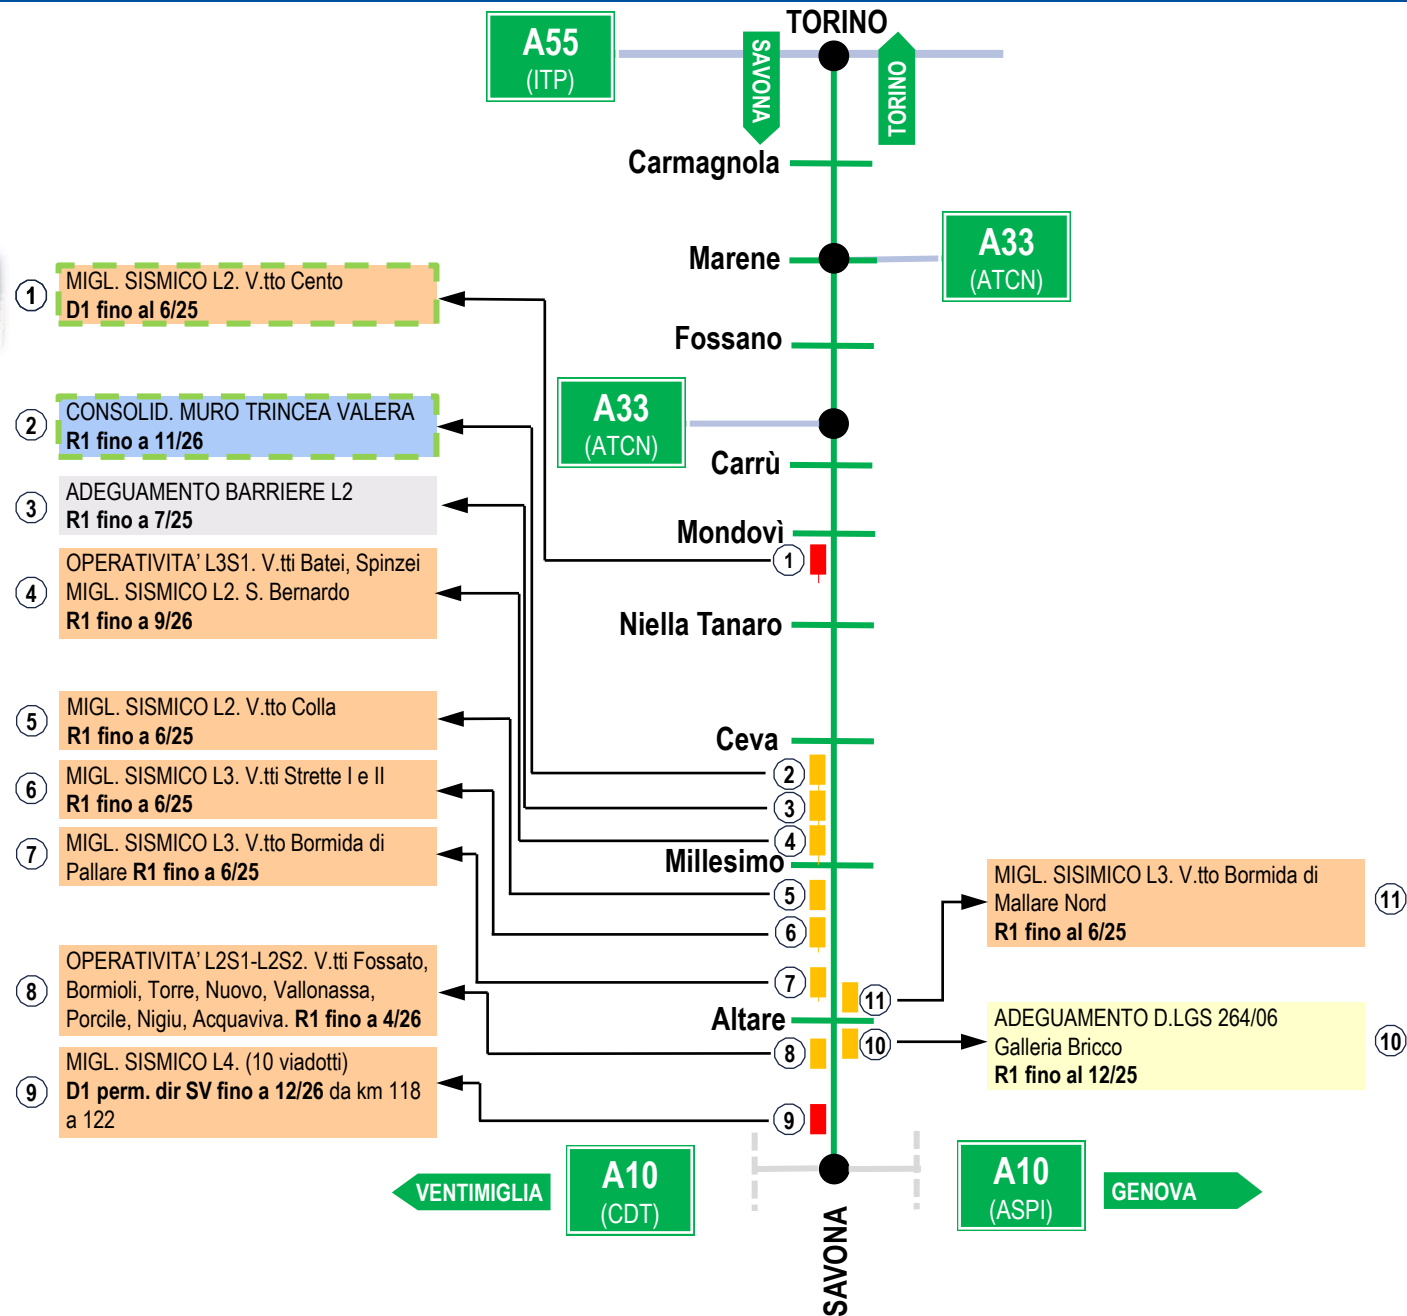

Configurazione FERIALE o festivi nella dir. di traffico minore

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	21,4	17,2
TORINO	124,3	12,1	9,7

Configurazione FESTIVI nella direzione di traffico prevalente

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	16,6	13,3
TORINO	124,3	9,7	7,8

(*) % di occupazione cantieri rispetto allo sviluppo della tratta

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana e festivi

✗ Cantiere rimosso

■	Tratti gestiti da ADF
■	Tratti non gestiti da ADF
■	Cantieri Deviazione (1D)
■	Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI	
■	Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
■	Interventi su barriere di sicurezza
■	Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
■	Barriere acustiche
■	Consolidamento versanti


5 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI DA GIOVEDÌ 17/04 A MARTEDÌ 22/04



Viadotto Cento



Viadotto San Bernardo

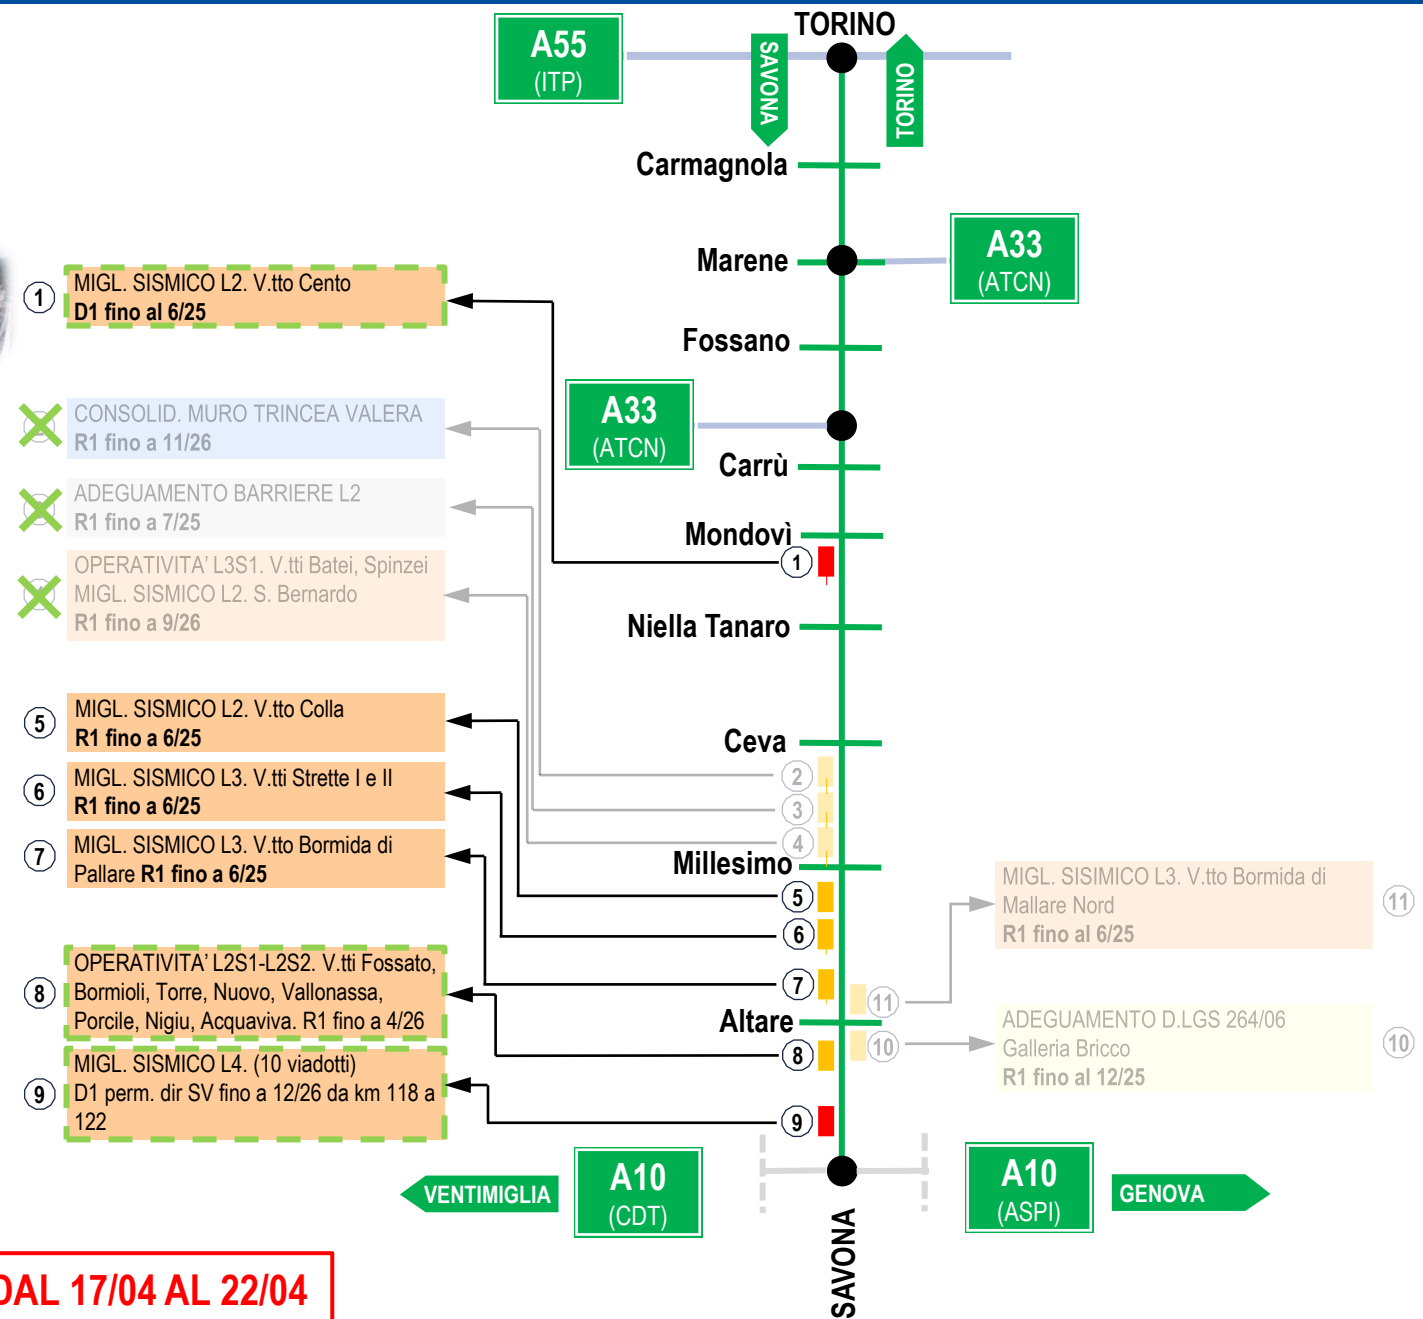

- ① MIGL. SISMICO L2. V.tto Cento
D1 fino al 6/25
- ✗ CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA
R1 fino a 11/26
- ✗ ADEGUAMENTO BARRIERE L2
R1 fino a 7/25
- ✗ OPERATIVITA' L3S1. V.tti Batei, Spinzei
MIGL. SISMICO L2. S. Bernardo
R1 fino a 9/26
- ⑤ MIGL. SISMICO L2. V.tto Colla
R1 fino a 6/25
- ⑥ MIGL. SISMICO L3. V.tti Strette I e II
R1 fino a 6/25
- ⑦ MIGL. SISMICO L3. V.tto Bormida di
Pallare R1 fino a 6/25
- ⑧ OPERATIVITA' L2S1-L2S2. V.tti Fossato,
Bormioli, Torre, Nuovo, Vallonassa,
Porcile, Nigiu, Acquaviva. R1 fino a 4/26
- ⑨ MIGL. SISMICO L4. (10 viadotti)
D1 perm. dir SV fino a 12/26 da km 118 a
122

- ⑪ MIGL. SISMICO L3. V.tto Bormida di
Mallare Nord
R1 fino al 6/25
- ⑩ ADEGUAMENTO D.LGS 264/06
Galleria Bricco
R1 fino al 12/25

Configurazione FERIALE o festivi nella dir. di traffico minore

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	15,6	12,5
TORINO	124,3	16,7	13,4

Configurazione FESTIVI nella direzione di traffico prevalente

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	3,6	2,9
TORINO	124,3	0,0	0,0

(*) % di occupazione cantieri rispetto allo sviluppo della tratta

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana e festivi


✗ Cantiere rimosso

- Tratti gestiti da ADF
- Tratti non gestiti da ADF
- Cantieri Deviazione (1D)
- Cantieri Riduzione (R1)

- ### LEGENDA INTERVENTI
- Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
 - Interventi su barriere di sicurezza
 - Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
 - Barriere acustiche
 - Consolidamento versanti

ESODO PASQUALE DAL 17/04 AL 22/04

6 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI DA MERCOLEDI' 23/04 A DOMENICA 4/05

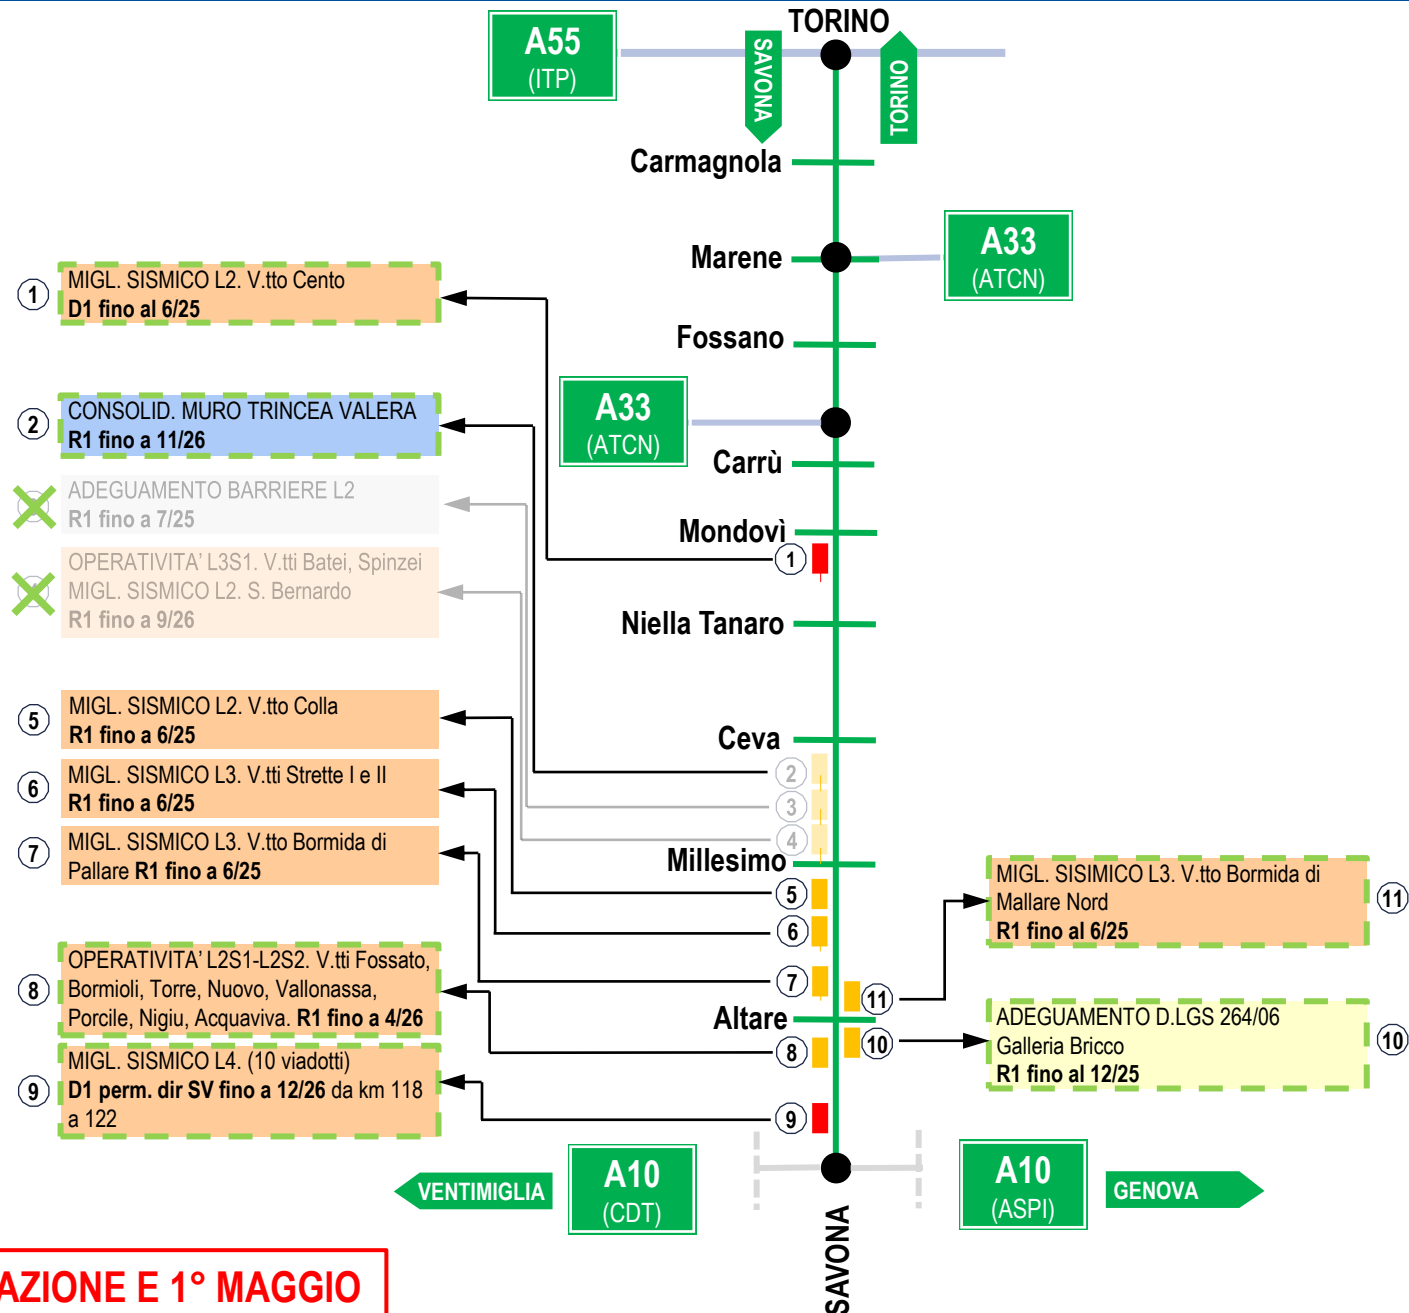

Configurazione FERIALE o festivi nella dir. di traffico minore

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	17,1	13,7
TORINO	124,3	16,7	13,4


Configurazione FESTIVI nella direzione di traffico prevalente

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	3,6	2,9
TORINO	124,3	0,0	0,0

(*) % di occupazione cantieri rispetto allo sviluppo della tratta

FESTA DELLA LIBERAZIONE E 1° MAGGIO

7 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 4/05 A VENERDI' 20/06

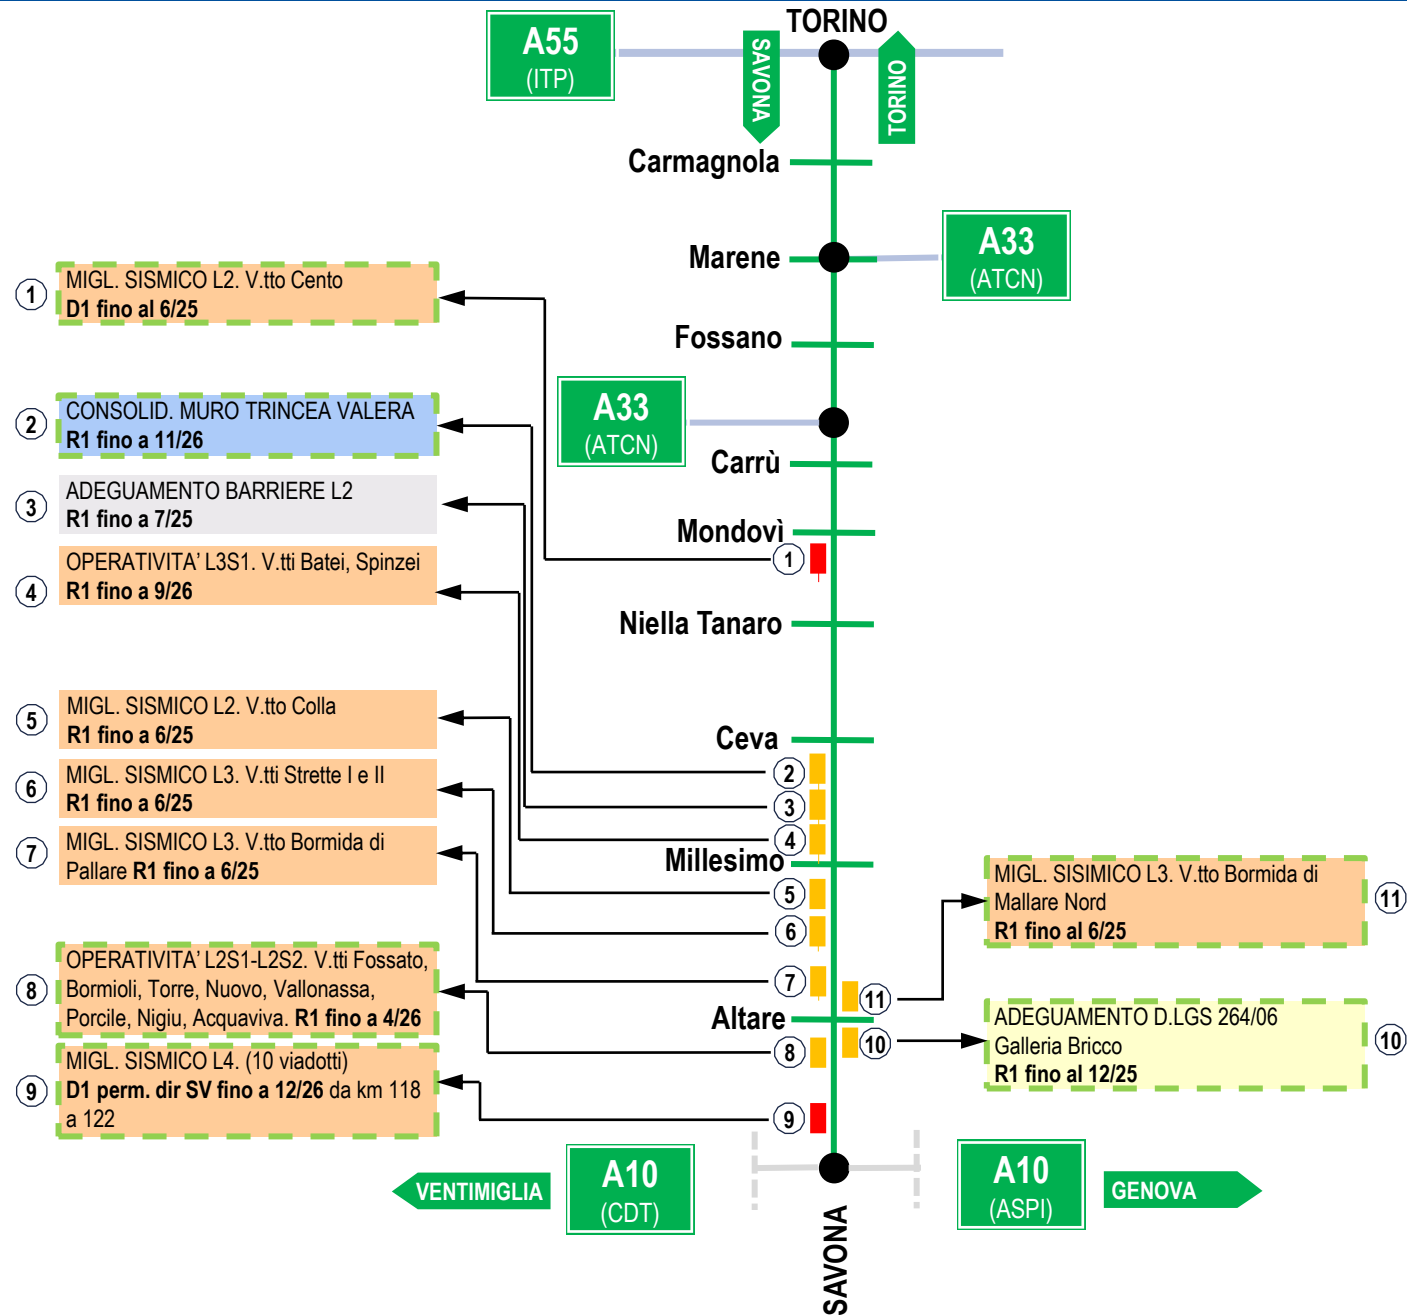

Configurazione FERIALE o festivi nella dir. di traffico minore

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	21,4	17,2
TORINO	124,3	16,7	13,4

Configurazione FESTIVI nella direzione di traffico prevalente


DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	7,8	6,3
TORINO	124,3	0,0	0,0

(*) % di occupazione cantieri rispetto allo sviluppo della tratta

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana e festivi

X Cantiere rimosso

8 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI DA SABATO 21/06 A DOMENICA 29/06

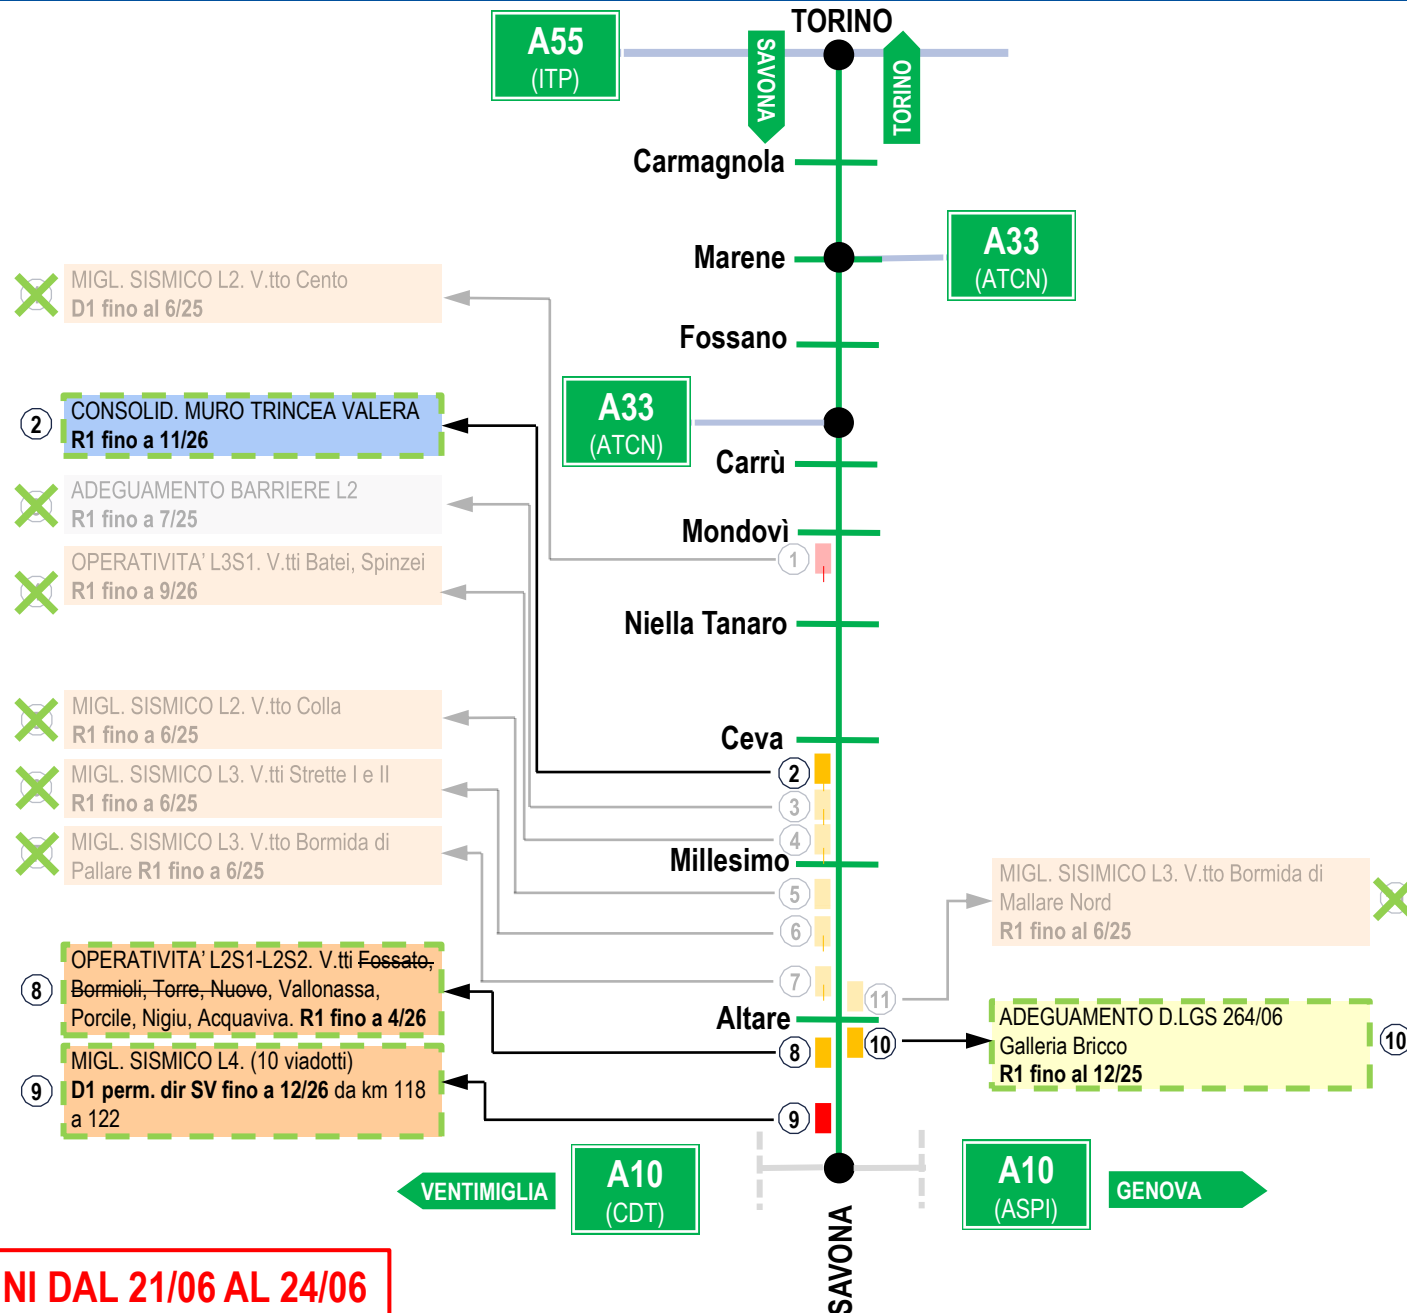

Configurazione FERIALE o festivi nella dir. di traffico minore

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	10,4	8,3
TORINO	124,3	8,7	7,0

Configurazione FESTIVI nella direzione di traffico prevalente

DIREZIONE	TRATTA (km)	CANTIERI (km)*	% (*)
SAVONA	124,3	0,0	0,0
TORINO	124,3	0,0	0,0

(*) % di occupazione cantieri rispetto allo sviluppo della tratta

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana e festivi

X Cantiere rimosso

- Tratti gestiti da ADF
- Tratti non gestiti da ADF
- Cantieri Deviazione (1D)
- Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
Interventi su barriere di sicurezza
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
Barriere acustiche
Consolidamento versanti

ESODO SAN GIOVANNI DAL 21/06 AL 24/06
